

Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree en overige informatie over het reilen en zeilen in De Horst

INHOUD

—
Werk aan de Luifel

—
Ventilatie

—
Werkzaamheden komende week

—
Oeps...



Werk aan de Luifel


Afgelopen week is er buiten onder andere gewerkt aan het plafond van de luifel

Binnen hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor het aanbrengen van verlaagde plafonds. Dit ging en gaat gepaard met irritant geboor...

Op onderstaande foto is goed zichtbaar dat het aanleggen van de elektra voorziening niet gaat om alleen wat draadjes weg te werken.



Het kan mogelijk zijn om af te (moeten) wijken van de planning. Ook kunnen werkzaamheden later starten of uitlopen. Graag uw begrip hiervoor!

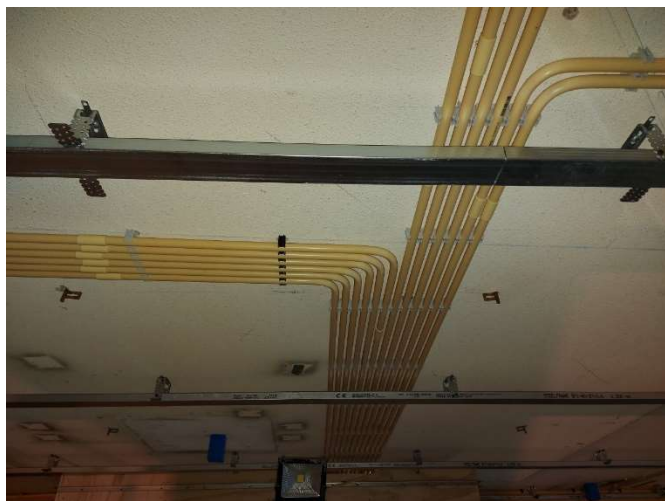



Ventilatie

In de kapsalon (links op de foto) zijn ventilatie kanalen aangebracht. De wanden zijn hier al dichtgemaakt en kunnen binnenkort worden voorzien van stucwerk. In de Winkel is een wand geplaatst waar achter de voorraad gestald kan worden.


Oeps...

Wateroverlast door lekkage

Helaas gaat er ook wel eens wat mis.... Donderdagavond werd er een forse lekkage ontdekt in de toekomstige kapsalon. Gelukkig dat de technisch medewerker en de receptionist aanwezig waren. Het was een heel waterballet waar tussen 18.00 en 21.30 uur aan gewerkt is om de lekkage te verhelpen en het water op te ruimen.

De oorzaak was een knelafsluiting die losgeraakt was....

Indien er minder warm water ervaren wordt, zit er mogelijk nog lucht in de leiding, de leiding een tijd doorspoelen help er vaak tegen.

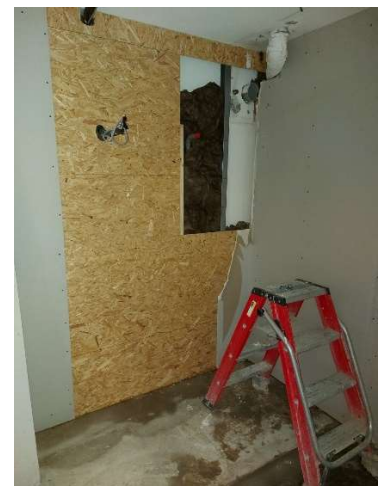

Werkzaamheden komende week

Buiten wordt er verder gewerkt aan de dakconstructie en als het weer meezit wordt het dak voorzien van dakbedekking.

De buitenwand wordt voorbereid voor de eiken betimmering. Binnen wordt er verder gewerkt aan de installaties (elektra en ventilatie). De plafonds zullen de week erna worden gesloten en dan zal er gestart worden met buitentegelwerk.

